


# 配管チェックシート

チェック項目の内容が、Yesの場合は「○」を、Noの場合は「×」をつけてチェックして下さい。  
※印の項目は試運転時のトラブルに、必ず確認して下さい。

★接続された駆動機器が動く可能性があります。  
作動時に治工具・設備の破損無き様注意願います。

システム全体  
使用後何年目ですか( 年 ヶ月)  
□※シリンダーが作動する  
□※動作中供給圧力が0.1MPa以上低下しない

[負荷・ガイド]  
□※フローティング機構が搭載されている  
□※ガイド部と心がずれていない  
□負荷変動が無い  
最低作動圧力の確認  
( MPaで動き出す)

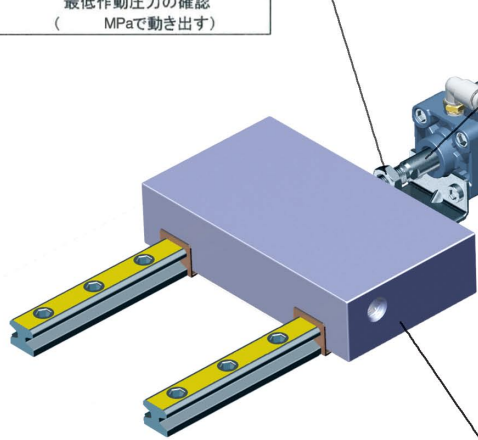

[ロッド]  
□漏れが無い  
□ロッド表面の傷が無い  
□粉塵・水等の飛散、付着が無い  
□グリスの状態に問題無い

[エアクション]  
□※調整は正常である

[電磁弁・パイロット弁]  
□※規定の電源が供給されている  
★□※マニュアル動作切換え良好  
□※最低作動圧力は供給されている  
□外傷が無い

[電磁弁・PEポート]  
□※プラグははかれて無い

[ルブリケーター]  
□貯油量は問題無い  
□滴下量に問題無い

[フィルタ]  
□エレメントの汚れが無い  
□ドレンの排出がされている

[動作・環境確認]  
□※必要なストロークエンドに達している  
□※外部又は内蔵のロック機構は解除している  
□外部ストッパは正常に機能している  
□ショックアブソーバの作動に問題がない

[チューブ]  
□結露・凍結は無い  
□折れ・つぶれは無い

[スピードコントローラ]  
□※メータイン・メータアウトの方向性が正しい  
□適した絞りの調整がされている

[サイレンサ]  
□消音材の詰まりは無い  
□消音材の汚れは無い  
□常時漏れは無い

[減圧弁]  
□※流れ方向(IN・OUT)が正しい  
□※圧力設定ができないノンリリーフタイプ  
□※設定圧力に(供給圧力の85%以下)問題が無い  
□※ボンネットシールの緩みが無い  
□※外部もれが無い(並列使いをしていない)  
□圧力計に異常な振れが無い

